1 Alpin - Terrengbearbeidelse.

Det meste av alpin området trenger kun bakkeplanering + - 1 til 1,5 m av skogs og morenemasse der stedlige masser kvernes som topplag i trase.Det er kun et område som må senkes grunnet motfall. Der det er motfall, kan det være behov for sprengning eller planering av skogsbunn eller morenemasser.Det er massebalanse i området.

Se oversikt: Bilder men nummer og tekst,1 til 9.

Område 1.Skogsbunn og morenemasse bakkeplaneres.

Område 2.Skogsbunn og morenemasse bakkeplaneres.
Mulig noe sprengning.


Område 3.Motfall ca 220 m langt ,forbi kafe bygg senkes ca 6,5 til 7,5 m,Sprengning må påregnes.
Område for kafebygg må senkes ca 3 ,5 m.

Område 4.Skogsbunn senkes og bakkeplaneres.
Ca + - 3 m,mulig noe sprengning.

Område 7.Skogsbunn Senkes og bakkeplaneres
Ca + - 2 m,mulig noe sprengning.

Område 8.Skogsbunn og morenemasse bakkeplaneres.

Område 9.Oppfylling av fjellskorte ca 4 m høyt. 30 m lang bredde ca 10 m,massen hentes fra punkt 8.

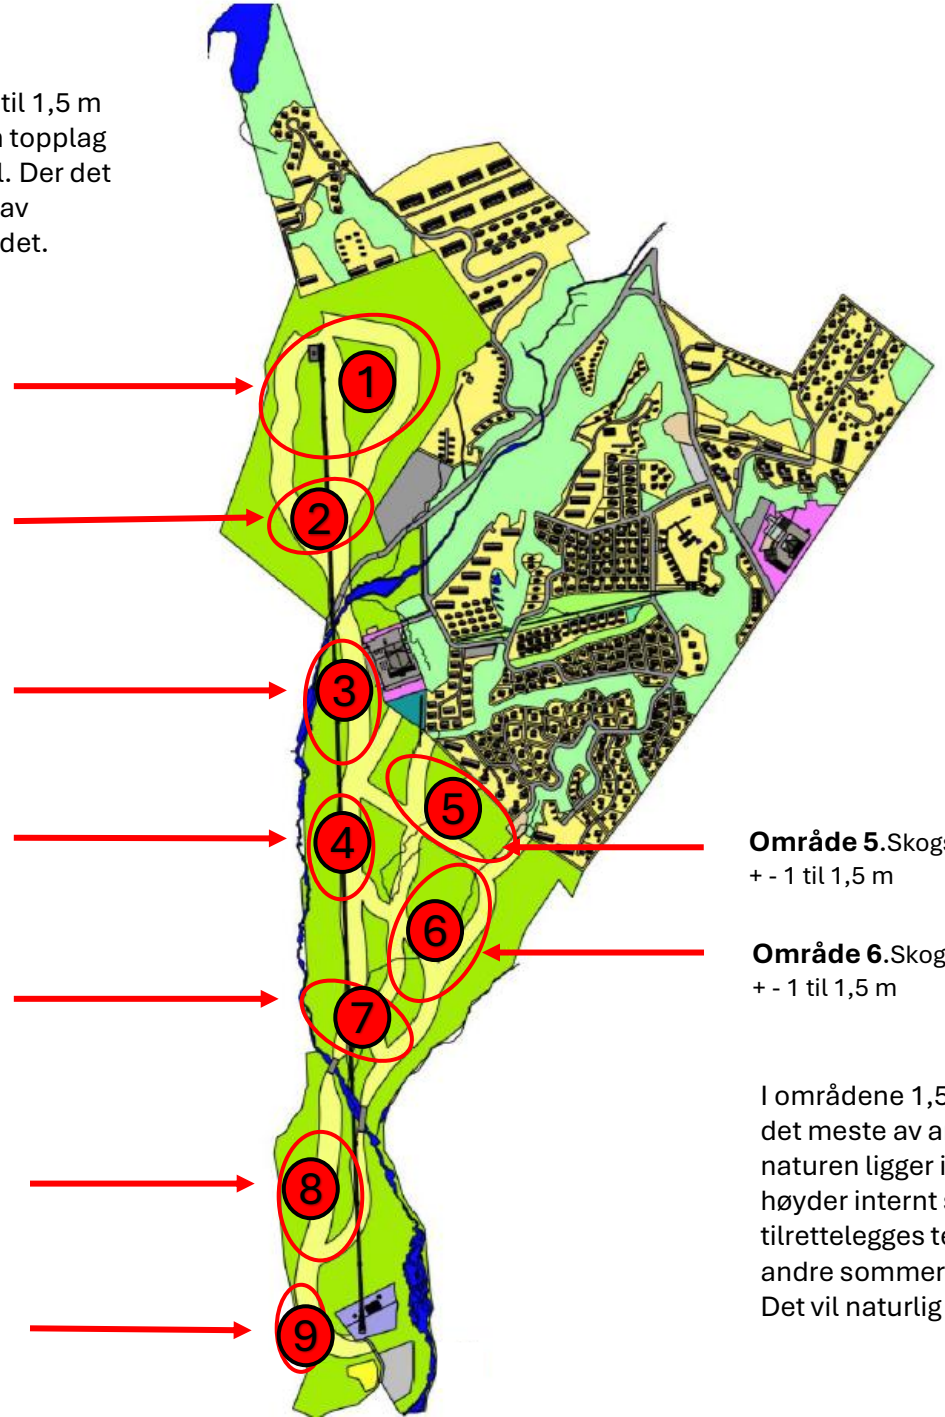


Område 5.Skogsbunn og morenemasse bakkeplaneres.
+ - 1 til 1,5 m

Område 6.Skogsbunn og morenemasse bakkeplaneres.
+ - 1 til 1,5 m

I områdene 1,5,6 samt mellom områdene 2,3,6, 7,8 og 9 som utgør det meste av arealet tas det sikte på å beholde kote høydens snitt slik naturen ligger i dag,men området har noen naturlige dumper og høyder internt som planeres opp mot naturlig kote høyde.I tillegg tilrettelegges terrenget for skapte høyde forskjeller til hopp o.lign,og andre sommeraktiviter som sykler sklier osv.
Det vil naturlig være noen flere enkeltplasser som må høyde justeres.


2

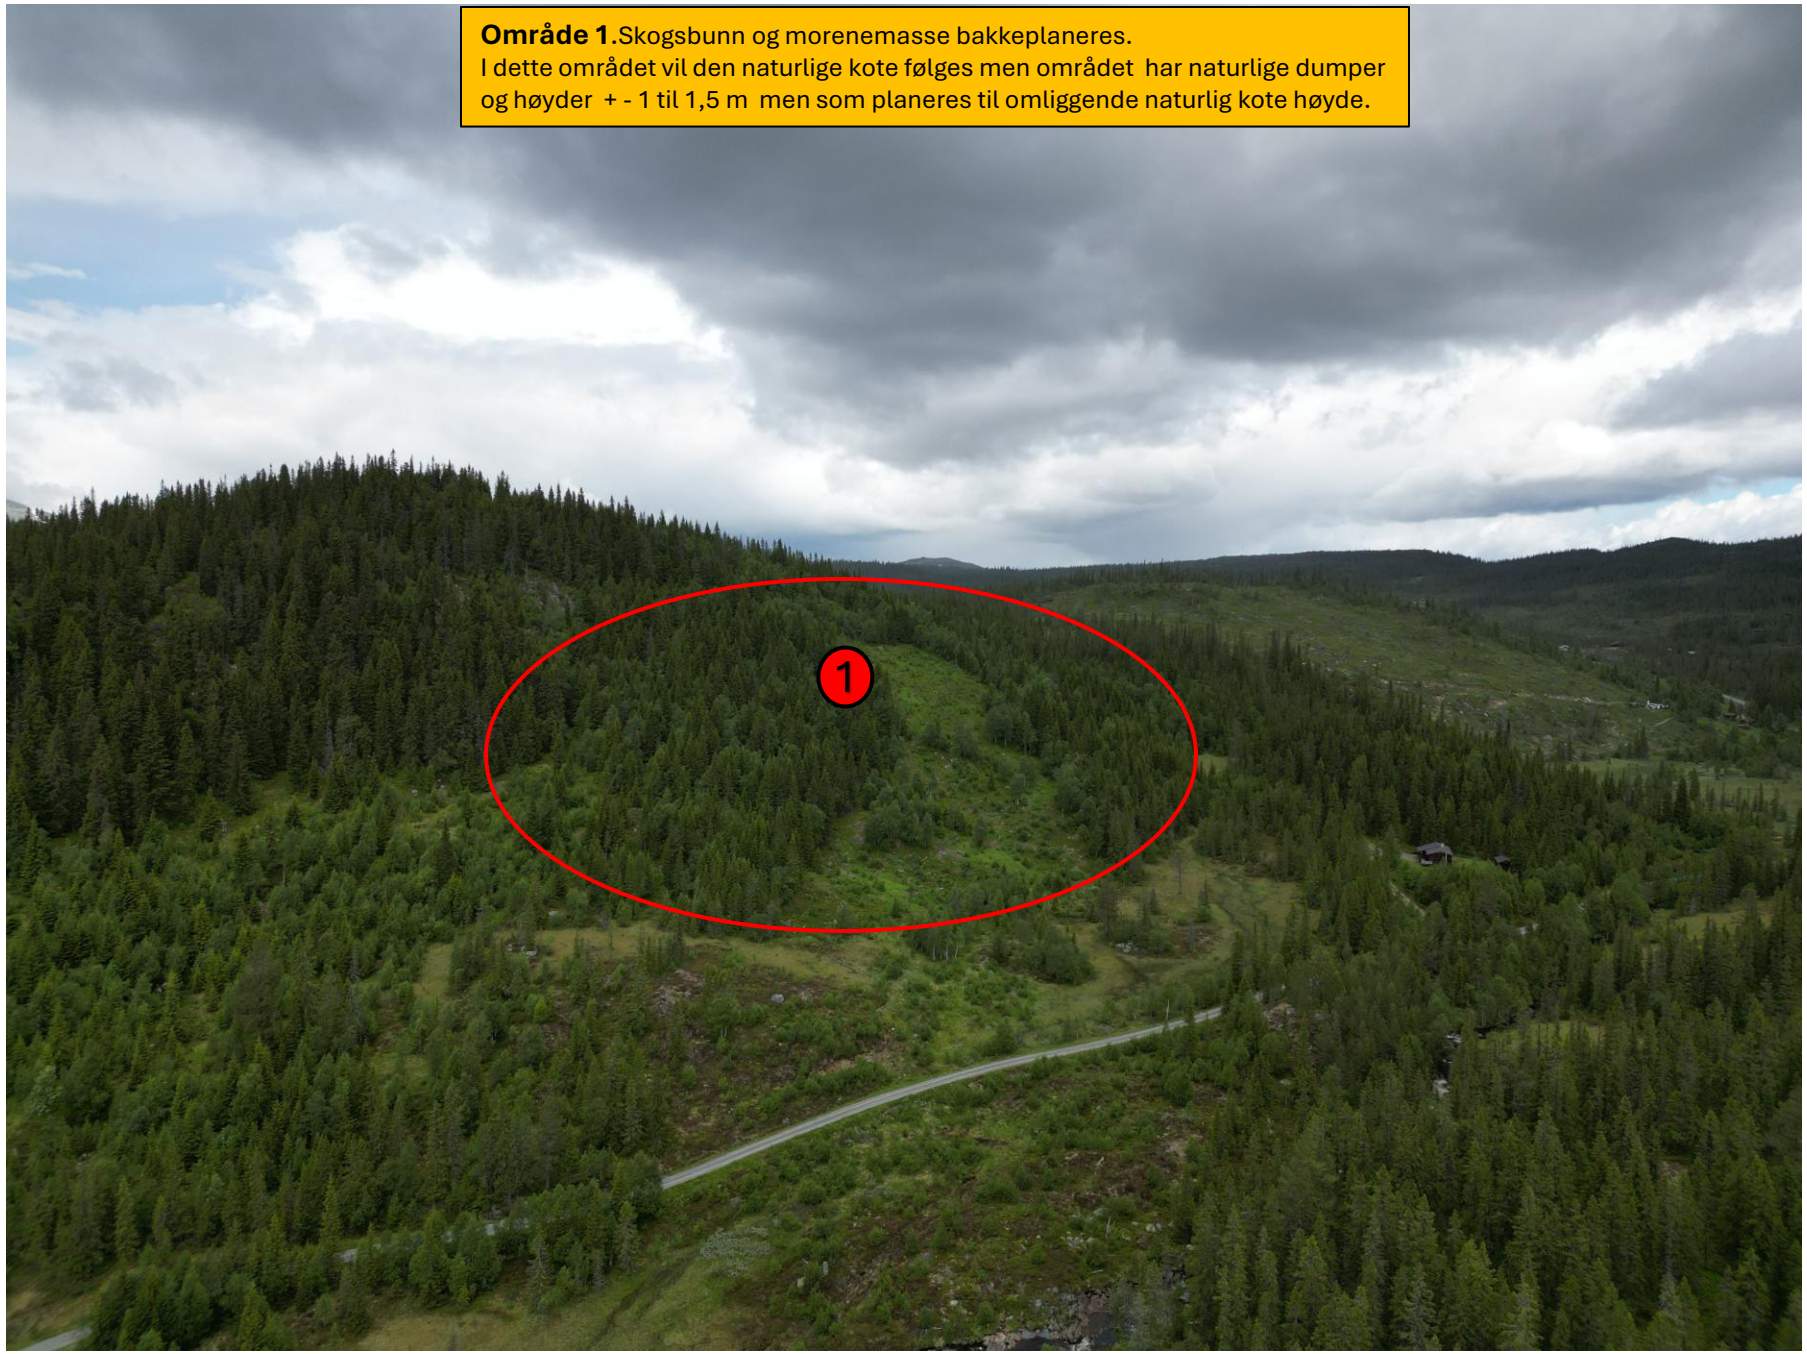
Område 1.Skogsbunn og morenemasse bakkeplaneres.
I dette området vil den naturlige kote følges men området har naturlige dumper og høyder + - 1 til 1,5 m men som planeres til omliggende naturlig kote høyde.
1

3



Område 2. Skogsbunn og morenemasse bakkeplaneres.
I dette området vil den naturlige kote følges men området har naturlige dumper og høyder + - 1 til 1,5 m men som planeres til omliggende naturlig kote høyde.
Mulig noe sprengning i dette området.
2

4

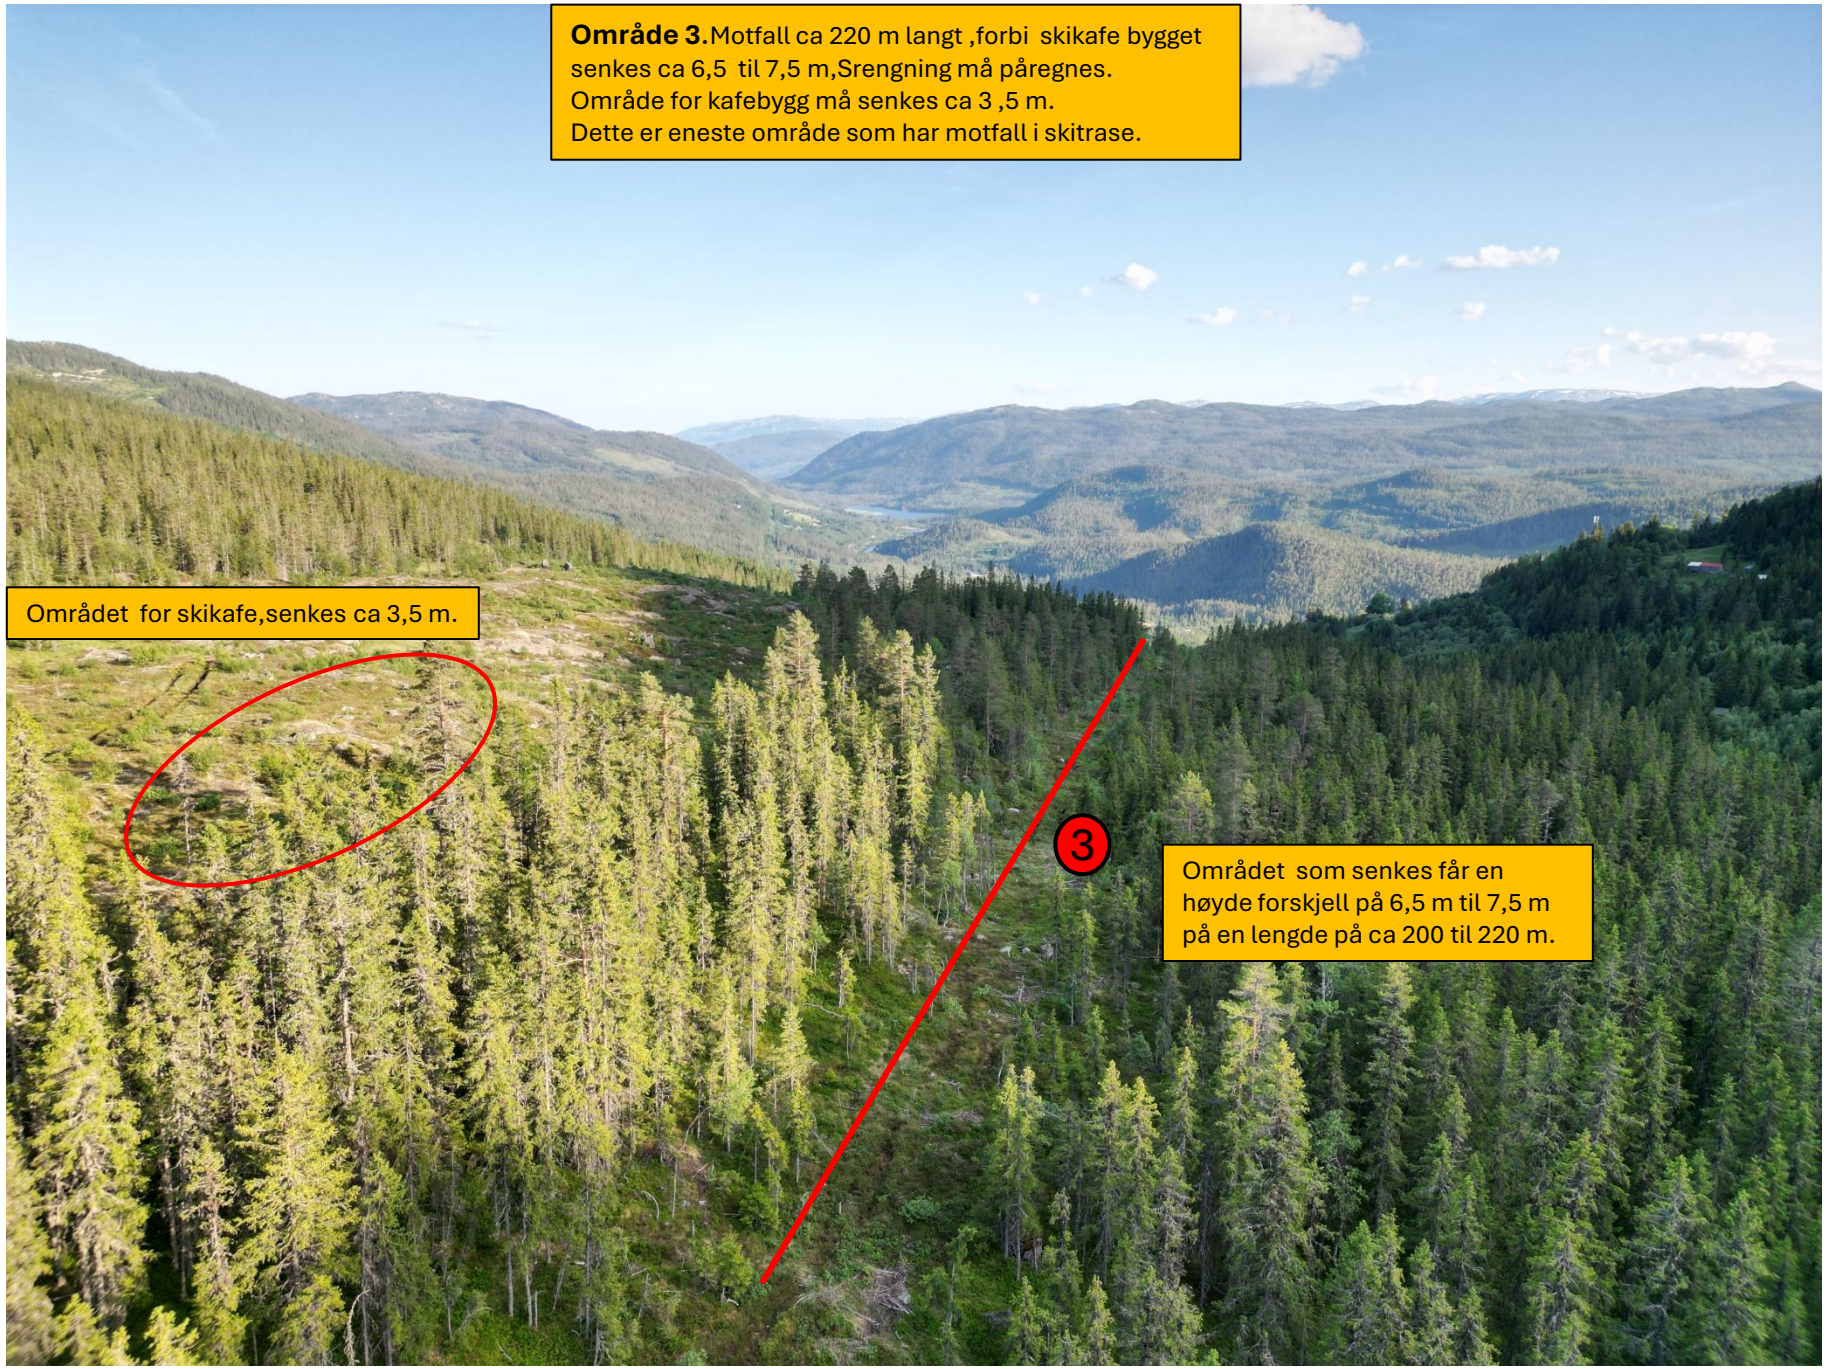
Område 3. Motfall ca 220 m langt ,forbi skikafe bygget senkes ca 6,5 til 7,5 m,Srengning må påregnes.
Område for kafebygg må senkes ca 3 ,5 m.
Dette er eneste område som har motfall i skitrase.
Området for skikafe,senkes ca 3,5 m.
3
Området som senkes får en høyde forskjell på 6,5 m til 7,5 m på en lengde på ca 200 til 220 m.


5

Område 4. Skogsbunn Senkes og bakkeplaneres.
ca + - 3 m,mulig noe sprengning.
Området er ca 20 m langt som må senkes til naturlig kote høyde,retning nord/sør som er i fallretningen .

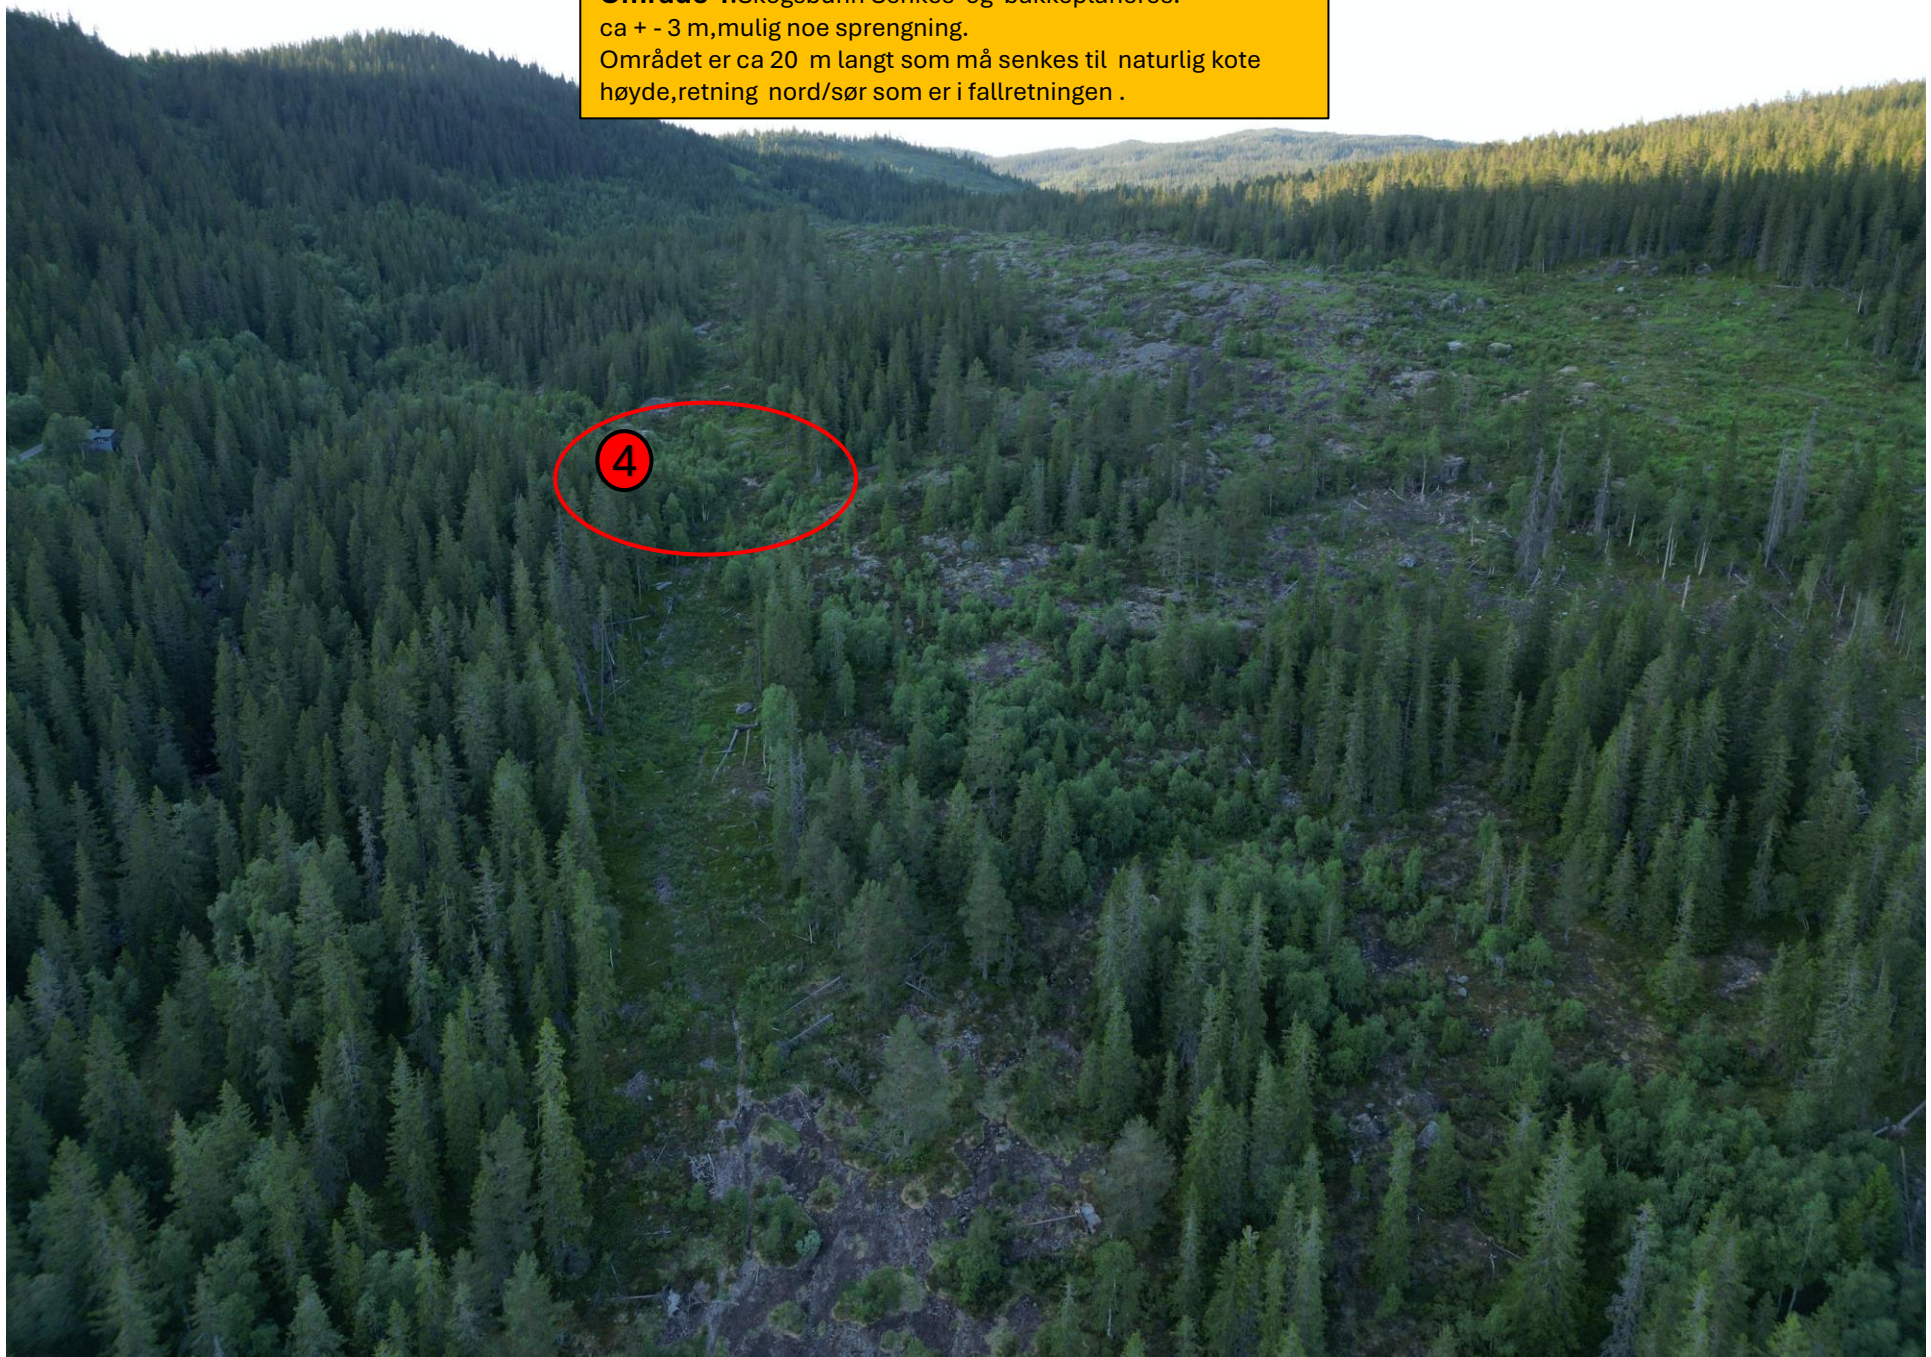


6

Område 5 og 6. Skogsbunn og morenemasse bakkeplaneres. +
- 1 til 1,5 m.
I dette område som alpin området generelt følges den naturlige kote i terrenget.

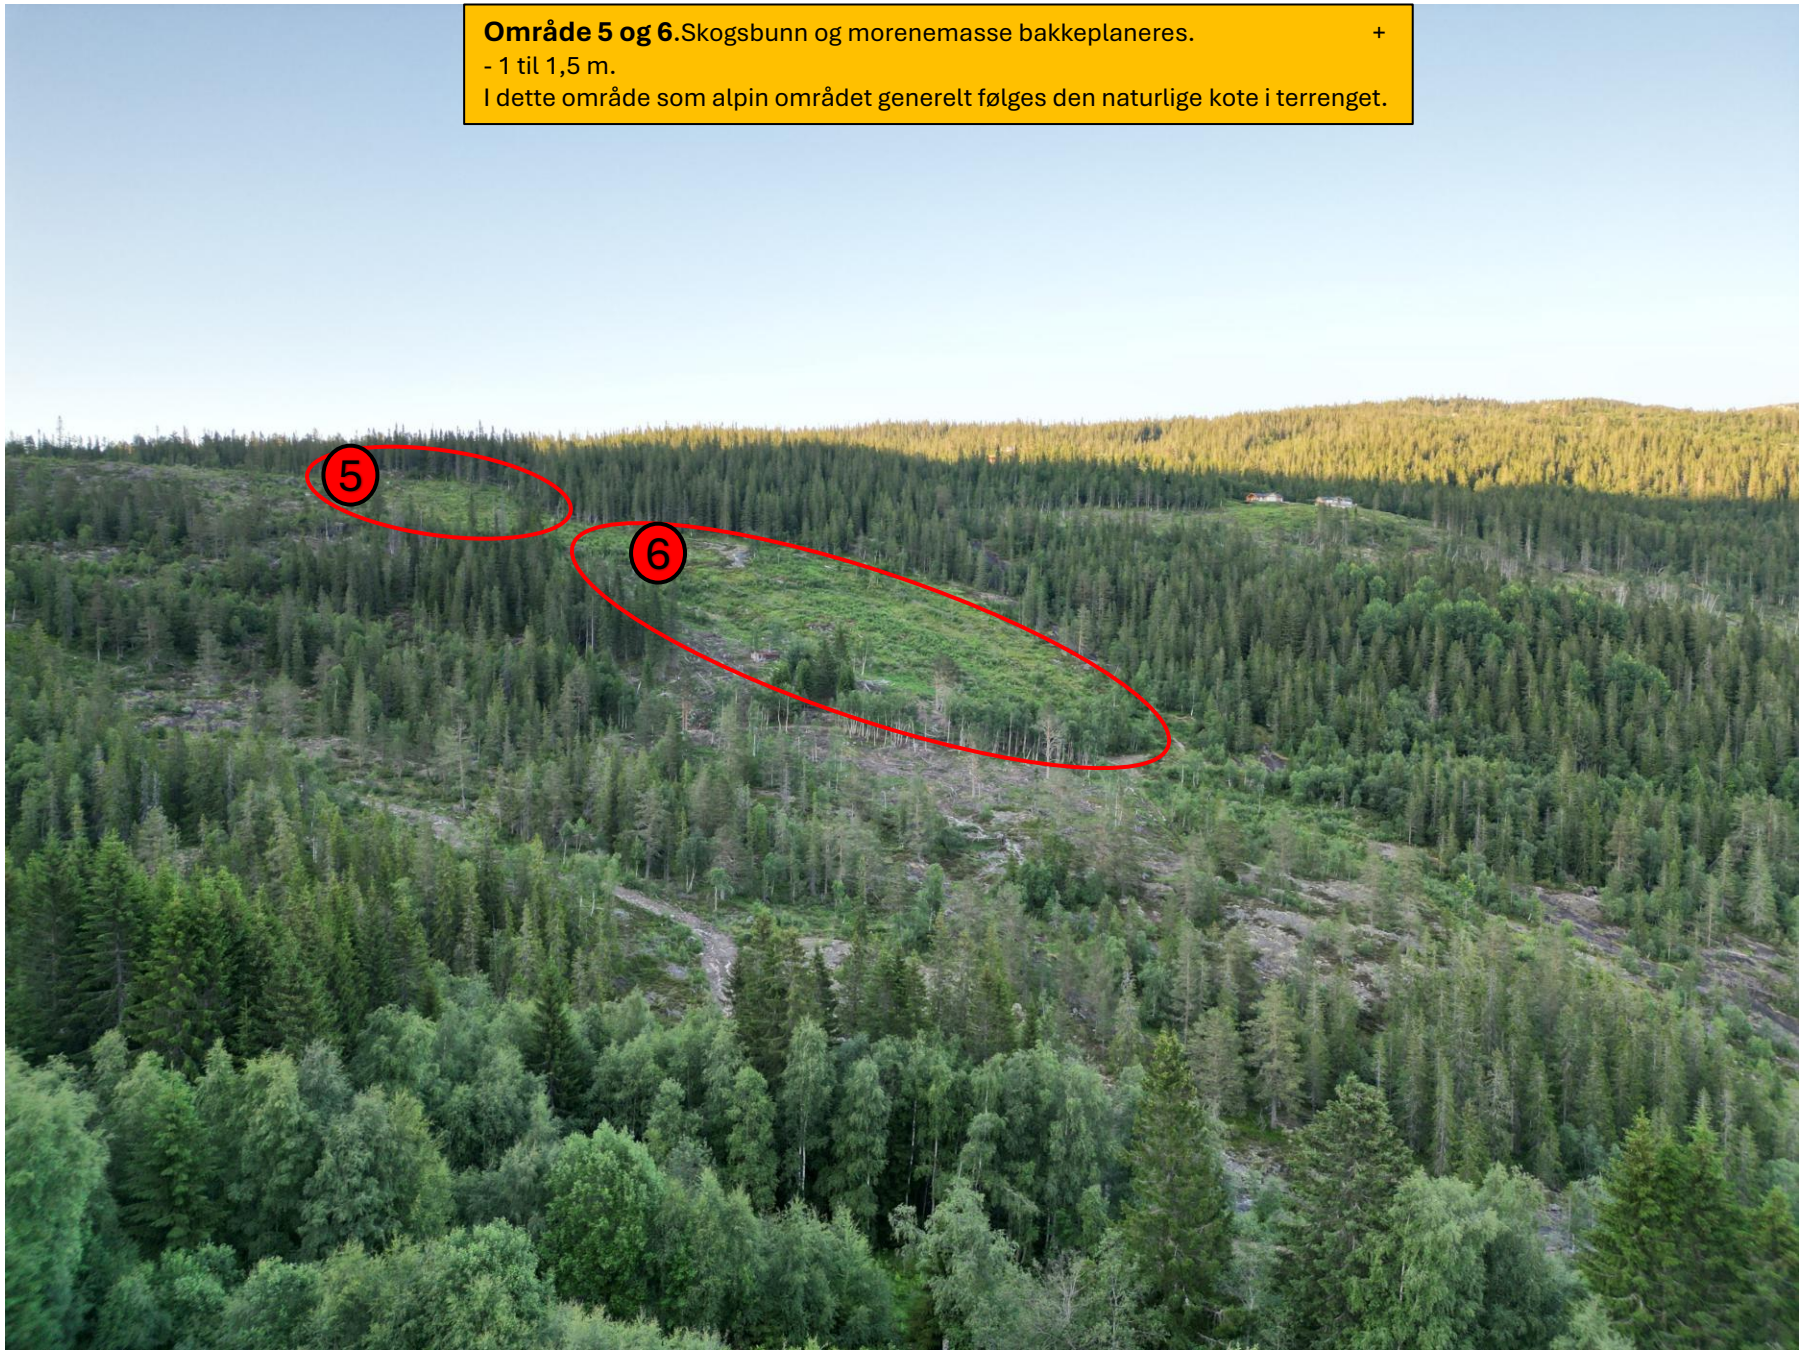


7

Område 7. Skogsbunn senkes og bakkeplaneres
ca + - 2 m,mulig noe sprengning.

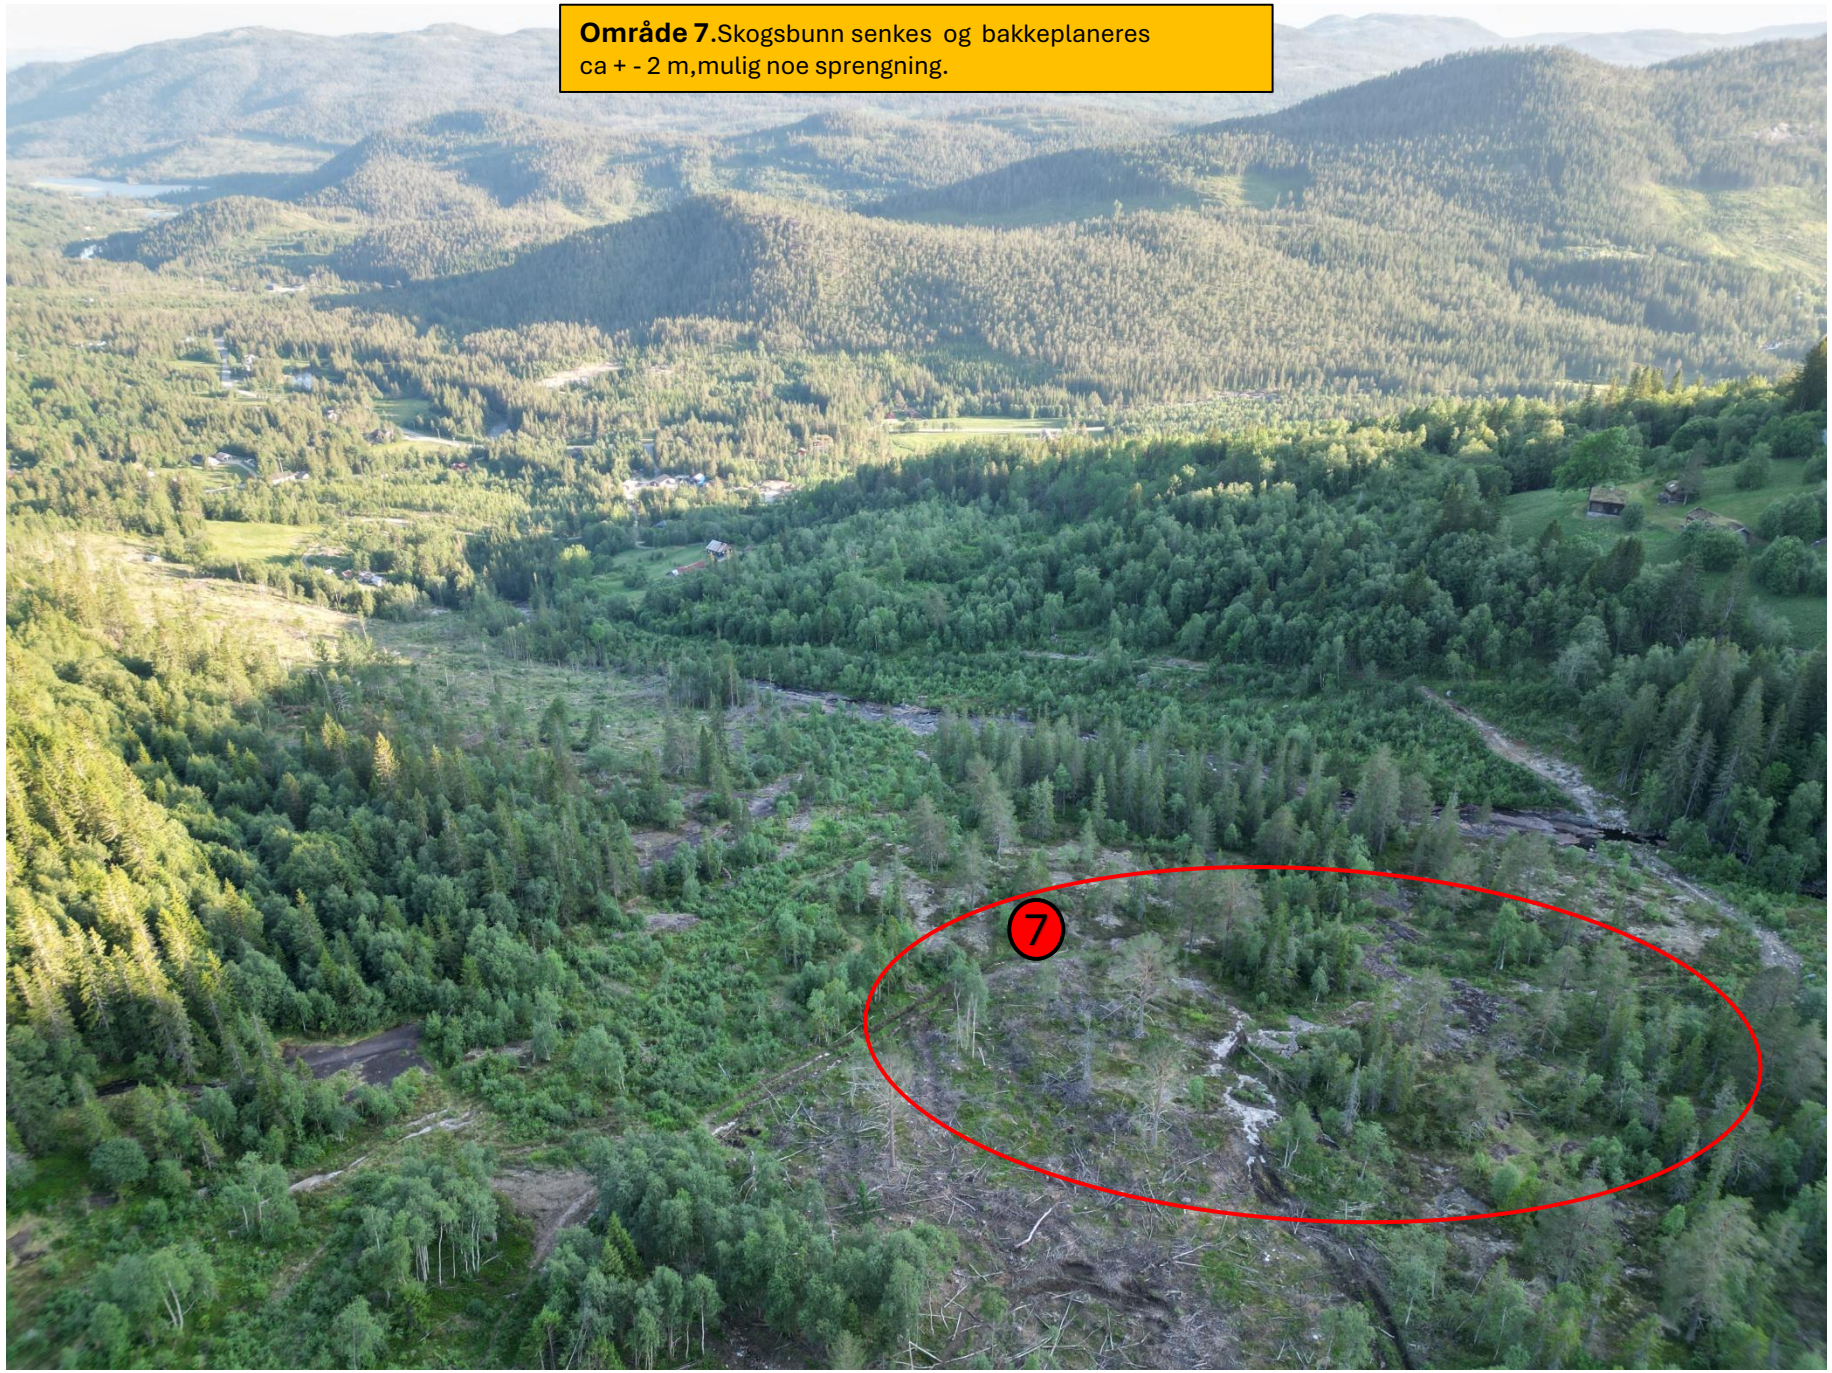

8

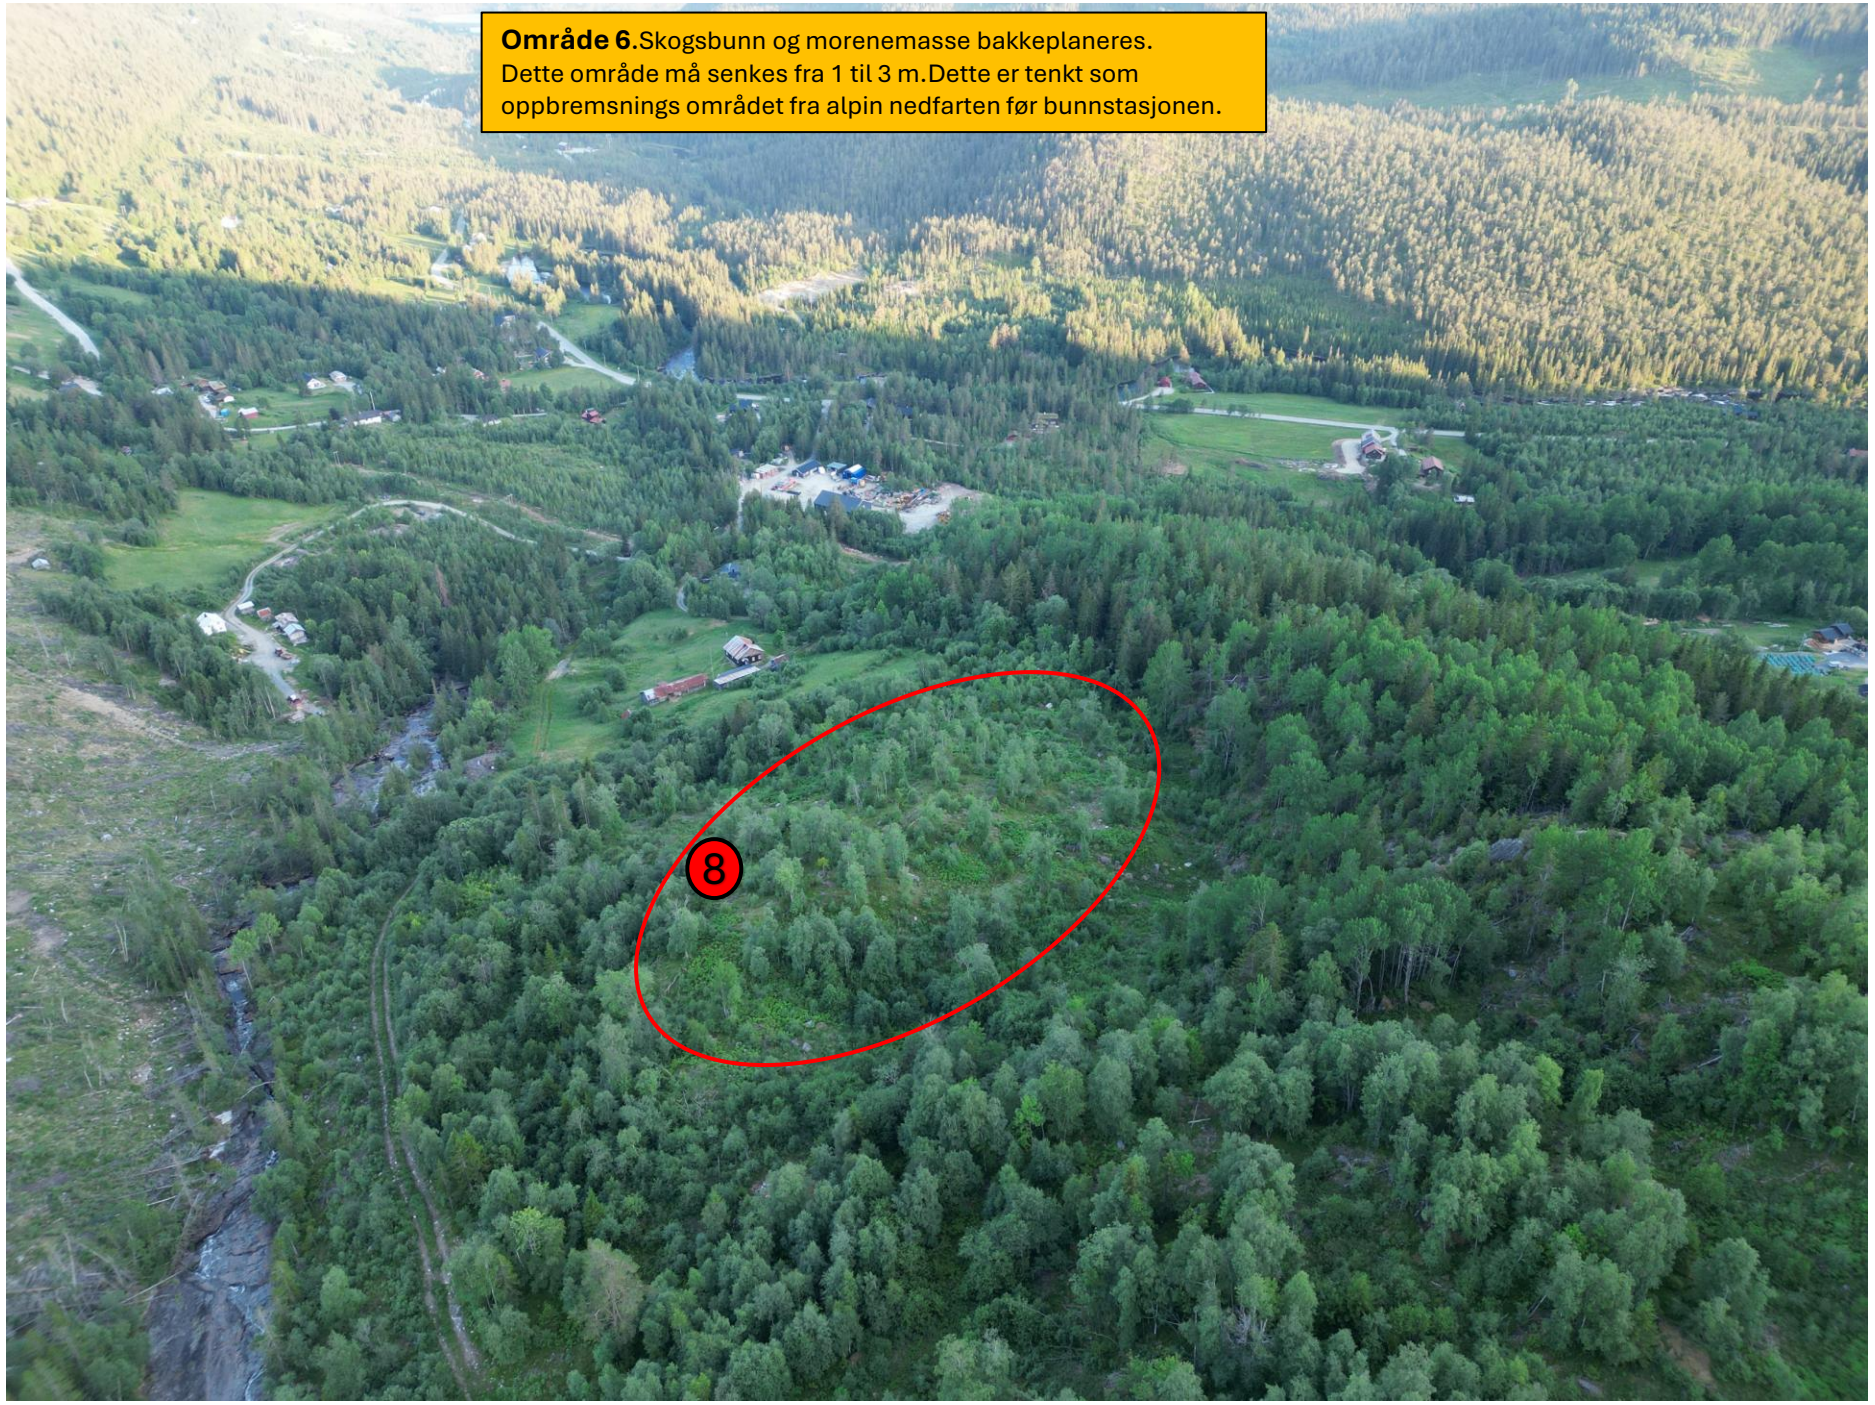

Område 6. Skogsbunn og morenemasse bakkeplaneres. Dette område må senkes fra 1 til 3 m.Dette er tenkt som oppbremsnings området fra alpin nedfarten før bunnstasjonen.

9

Område 9.Oppfylling av fjellskorte ca 4 m høyt. 30 m lang bredde ca 10 m,massen hentes fra området 8.

